SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN · 2025/26

Music Playlist Manager

Sprint 1 Review · Release, Backlog aggiornato, Metriche e Retrospettiva

Gruppo 02

Apicella Francesco
Campagna Lorenzo
Cutolo Raffaele
Gioia Errico

4 giugno 2026

Seconda consegna

SPRINT 1 · OBIETTIVO

Le fondamenta del prodotto

Obiettivo: a fine Sprint l'utente può gestire la libreria di tracce (creare, modificare, eliminare, visualizzare) e creare, eliminare e popolare le playlist. Riproduzione e UI real-time sono rinviate allo Sprint 2 — poggiano sulle entità di dominio definite ora.

8
User Stories selezionate

12
Story Points pianificati

~35h
ore-uomo pianificate

36h
capacity (9h × 4 membri)

User Stories dello Sprint 1

US-01–04	CRUD tracce: crea · modifica · elimina · visualizza
US-05a/b	Crea ed elimina playlist
US-06a/b	Aggiungi e rimuovi tracce in playlist

SPRINT RELEASE · DEMO

Cosa è stato rilasciato

Una libreria musicale pienamente funzionante: tutte le 8 US dello Sprint sono "Done".
Di seguito i blocchi che mostreremo nella demo dal vivo.

Gestione tracce

Aggiunta, modifica ed eliminazione di tracce con titolo, autore, durata, genere e anno. L'eliminazione si propaga a tutte le playlist che la contengono.

Gestione playlist

Creazione con nome univoco (controllo duplicati case-insensitive), eliminazione, aggiunta e rimozione di tracce senza duplicati.

Modello osservabile

Tracce e playlist su `ObservableList`: la TableView e le viste si aggiornano da sole a ogni modifica, base pronta per la UI real-time.

Validazione & errori

Validazione centralizzata (campi non vuoti, durata > 0, anno valido): input non validi vengono bloccati con messaggi chiari, il modello resta integro.

Story Points, velocity e problemi

12
SP pianificati

12
SP completati

12
Velocity (1° sprint)

8 / 8
User Stories "Done"

Tutte le US selezionate sono state completate.

PROBLEMI E NOTE EMERSE


Debito tecnico pianificato. I metodi `undo()` sono TODO espliciti collegati a US-12 — debito noto e tracciato, non accidentale.

Backlog. Grooming: le epiche US-05/06 sono state divise in a/b per task più piccoli e checkpoint intermedi più frequenti.

BURNDOWN DI PROGETTO

Story Points residui sull'intero backlog

Backlog totale 54 SP. A fine Sprint 1 restano 42 SP. La linea tratteggiata proietta la velocity di 18 SP/sprint: per time-boxing l'obiettivo realistico è il nucleo ad alta priorità.

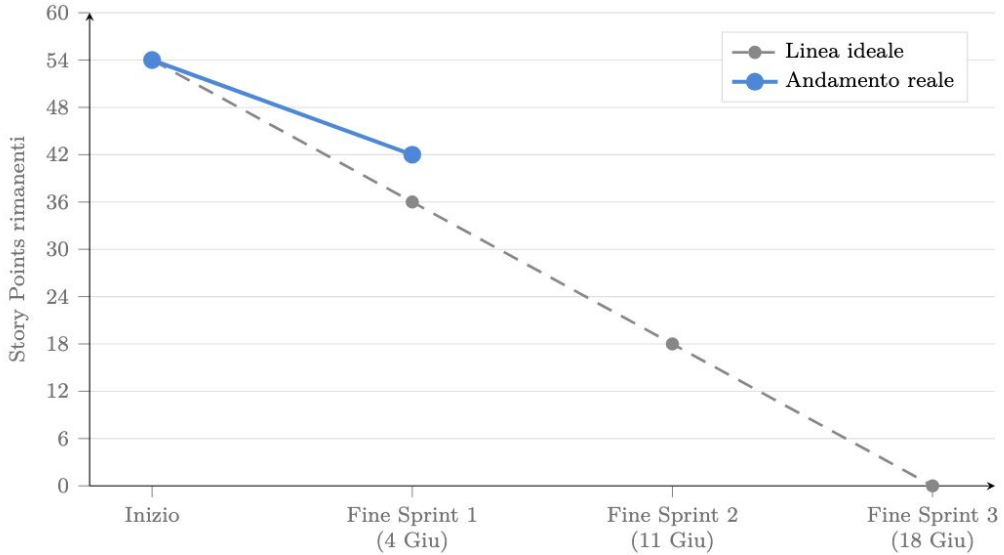

Cosa cambiamo nel processo

Keep doing	Ownership verticale per US (ognuno tocca tutto lo stack) · sessione di design condivisa prima dello split · test scritti insieme al codice.
More of	Concordare in anticipo le interfacce tra parti · integrare il codice più spesso (più volte al giorno, non solo a fine giornata).
Start	Tracciare con più rigore le ore reali per task su Trello · checklist di "Definition of Done" verificata prima di chiudere una US.
Less of	Story troppo grandi e poco scomposte (già mitigato dallo split a/b) · merge concentrati nelle ultime ore dello Sprint.
Stop	Lasciare l'integrazione all'ultimo giorno · confini dei task ambigui tra membri.

PROSSIMI PASSI

Sprint 2 — Riproduzione e UI real-time

Con il dominio e i Service già pronti, lo Sprint 2 costruisce sopra di essi la riproduzione e l'aggiornamento della UI in tempo reale.

Playback

US-07a · US-07b · US-08

Play / pausa / skip e scelta della modalità (sequenziale · shuffle · loop) con Strategy + Factory.

UI in tempo reale

US-10 · US-11

Pannello "Now Playing" e playlist che evidenzia la traccia corrente, via Observer su ObservableList.

Modifica live

US-09a · US-09b · US-12

Aggiunta e rimozione di tracce nella playlist durante la riproduzione, senza interruzioni.

Grazie per l'attenzione.

github.com/fra343/Gruppo2-SAD
trello.com/b/Mpb9bjYE/sad
