Music Playlist Manager – Burndown Chart

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Stato di avanzamento

I seguenti indicatori sintetizzano lo stato del progetto al termine dello Sprint 3, calcolati sul totale di 54 Story Points previsti dal Product Backlog.

SP Totali	SP Completati	SP Rimanenti	Velocity Sprint 3
54	54	0	18 SP

2 Burndown Chart

Il burndown di progetto confronta gli Story Points ancora rimanenti (andamento reale) con la riduzione lineare attesa (linea ideale) lungo i tre sprint pianificati.

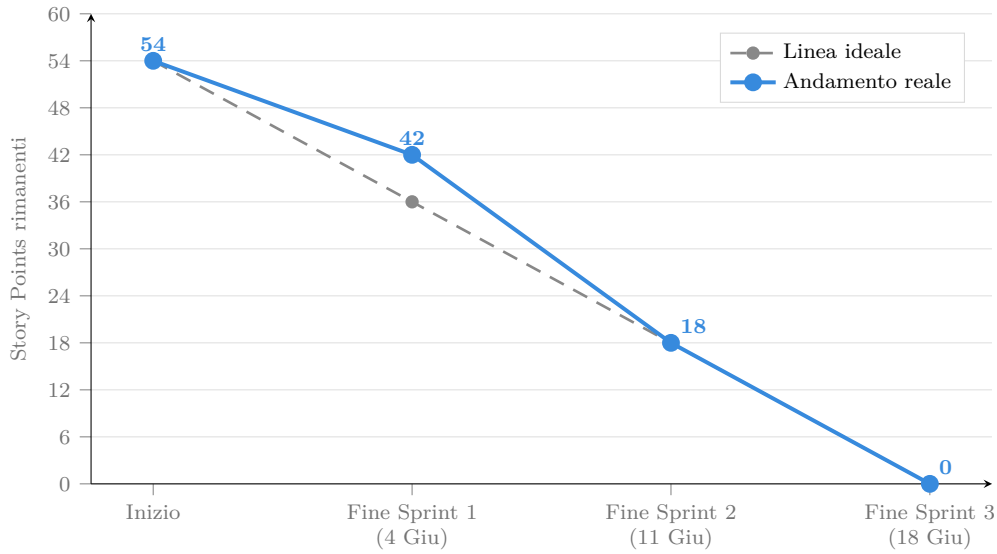


Figura 1: Burndown Chart di progetto al termine dello Sprint 3.

Lettura del grafico. Al termine dello Sprint 1 i punti rimanenti (42) si discostavano di +6 SP dalla linea ideale (36), per via di una stima volutamente prudente al primo sprint. Lo Sprint 2 ha completato 24 SP, il doppio della velocity iniziale, portando i punti rimanenti a 18, esattamente sulla linea ideale e riassorbendo completamente lo scostamento accumulato. Lo Sprint 3 ha completato i 18 SP residui (tutte le user stories ancora aperte a Media e Bassa priorità), portando i punti rimanenti a 0: l'andamento reale converge sulla linea ideale e il progetto chiude l'intero scope pianificato del Product Backlog (54 SP su 54). La velocity media sui tre sprint è di 18 SP/sprint.
